

2010-01-26

Samråd- och fastställandeprocess av vattenskyddsområde för Fjärås Bräcka vattentäkt

I text nedan beskrivs planerad utformning av fastställande- och samrådsprocess rubricerade arbete.

Genomförda moment

- Kommunen har tillsatt en intern arbetsgrupp med deltagare ifrån Miljökontor och Tekniska förvaltningen. Ulf Carlsson från teknik utgör processledare med ansvar för att leda fastställandeprocessen och fungerar som kommunens kontaktperson under processen.
- Utformning av samrådsprocess har skett i samråd med representanter från teknik och Miljö- och hälsoskydd.
- Teknisk utredning med förslag till avgränsning av skydds-zoner för både yt- och grundvatten har utarbetats.

Planerade moment

Nedan beskrivs fastställandeprocessen samt bedömd tid för genomförande av respektive moment. Samrådsprocessen är dock svår att tidsuppskatta och kommunen avser justera tidplanen vid behov.

Steg 1 (jan-feb 2010): Informera tekniska nämnden (TN) och miljönämnden (MN) inom Kungsbacka kommun. Detta bedöms kunna göras i slutet av januari. Information skall ges om:

- processutformning
- förslag till avgränsning
- ersättningskrav

TN tar beslut om att gå vidare med processen och föreslaget skyddsområde. Eventuella revideringar görs.

Steg 2 (feb-mars/april 2010): Extern samrådsprocess inleds. Som ett första steg informeras Lygnerns vattenråd om arbetet. Syftet med det tidiga samrådet är att informera om pågående arbete och samrådsprocessens utformning, samt identifiera viktigare intressen i området och ge dessa en möjlighet att påverka framtagande av skyddsföreskrifter. En intressentlista över aktörer som bör inkluderas i samrådsprocessen tas fram.

Vid möten med intressegrupper informeras om samrådsprocessen, den tekniska utredningen och föreslagen avgränsning av vattenskyddsområde. Diskussionsunderlag för utformning av skyddsföreskrifter överlämnas och utgörs av

- Naturvårdsverkets allmänna råd

- Befintliga föreskrifter för Fjärås bräcka skyddsområde
- Utkast till skyddsföreskrifter baserad på exempel från andra skyddsområden. Både specificeringsgrad som anger vilka verksamheter som ska regleras och restriktionsnivå dvs föreskrifternas stränghet lämnas öppna för diskussion/synpunkter. Som utgångspunkt exemplifieras med utformning från andra skyddsområden.

De intressegrupper som identifierats ges därmed möjlighet att inkomma med synpunkter som beaktas vid utformning av första förslag skyddsföreskrifter. Synpunkter gällande utlämnade exempel lämnas skriftligen. Vid behov genomförs ytterligare ett möte där inkomna synpunkter diskuteras.

Steg 3 (april – maj 2010): Utarbetning av första förslag till skyddsföreskrifter. Arbetet genomförs gemensamt av representanter från Teknik och Miljö- och hälsoskyddskontoret och beaktar inkomna synpunkter från föregående skede. Förberedande arbete kan påbörjas tidigare, bla identifiera vilka verksamheter/risker som bör regleras och lämplig specificeringsgrad i föreskrifter. I detta skede bör kommunen även fundera över hur föreskrifternas tillämpning ska hanteras av tillsynsmyndigheten.

Steg 4 (maj -juni 2010): Internremiss föreskrifter + vattenskyddsområde till TN och MN. Inhämta yttranden innan utställning för allmänheten och övriga berörda.

Steg 5 (sept-okt 2010): Tidigt samråd med allmänheten och övriga intressenter. Kommer att hållas i form av en utställning, förslagsvis på naturrummet på Fjärås bräcka. Kungörelse går ut via tidningar. Eventuellt föregås utställningen av ett informationsutskick med en karta över förslaget skyddsområde och skyddsföreskrifter och ev en informationsskrift om vad det betyder att bo inom ett vattenskyddsområde. I samband med utställningen/utskick ges möjlighet för samtliga berörda att lämna synpunkter på förslaget.

Efter utställningen avslutas den inledande samrådsprocessen och härefter följer ärendet den formella gången.


Steg 6 (okt-nov 2010): Sammanställning av inkomna synpunkter under det tidiga samrådet i en samrådsredogörelse. Ev. revidering av förslag utifrån inkomna synpunkter.

Steg 7 (nov-dec 2010): Förslaget går till TN och MN samt kommunfullmäktige/kommunstyrelsen för att godkänna att förslaget skickas till Länsstyrelse för fastställelse.

Steg 8 (dec 2010-våren 2011): Ansökan skickas till Länsstyrelsen för fastställelse. Här efter tar Länsstyrelsen över samrådsprocessen som följer den sedvanliga processuella hanteringen med myndigheter och sakägare. Alla som skrivit upp sig på lista vid det tidiga samrådet får skriftligt utskick.

Steg 9 (våren 2011): Inkomna yttranden bemöts och vid behov genomför kommunen revidering av förslag.

Steg 10 (sommaren/hösten 2011): Fastställelse av Länsstyrelsen.

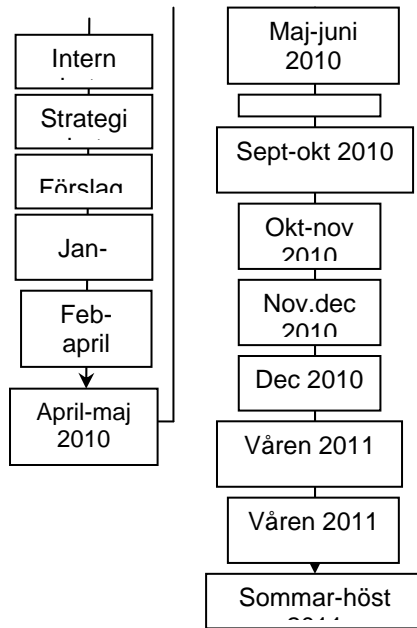

Figur: Samråd- och fastställandeprocess för skyddsområde - Fjärås Bräcka vattentäkt, Kungsbacka kommun. Observera att angivna tider är högst preliminära.
